

Realizace projektu



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Projekt z Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Výzva: 6. výzva OPŽP

<http://www.sfzp.cz/>

<http://www.opzp.cz/>

Hřbitov sv. Vojtěcha – revitalizace zeleně

Registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/08.02804

Příjemce podpory	MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
------------------	-----------------------------

Realizace projektu	7/2009 – 4/2010
Zahájení fyzické realizace projektu	9. 10. 2009
Dokončení fyzické realizace projektu	22. 12. 2009
Předání prací	22. 12. 2009

Realizace projektu

Dne 19. 8. 2009 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele prací projektu „Hřbitov sv. Vojtěch - revitalizace zeleně“. Vyhodnocení výběrového řízení proběhlo dne 3. 9. 2009. Smlouva s vítězem výběrového řízení firmou ZAHRADA HARTA, s.r.o., Vysoké Mýto byla podepsána den 9. 10. 2009 na základě usnesení RM č. 873/09 ze dne 5. 10. 2009.

Fyzická realizace projektu „Hřbitov sv. Vojtěcha – revitalizace zeleně“ byla zahájena dne 9. 10. 2009 předáním staveniště a vlastní zahájení revitalizace začalo dne 12. 10. 2009.

Realizace stavby byla zajišťována zhotovitelem podle schválené projektové dokumentace. Kontrola plnění harmonogramu, kvality díla revitalizace a bezpečnost práce na stavbě byla zajišťována technickým dozorem na základě uzavřené smlouvy a prováděním pravidelných kontrolní dnů.

Realizace začala prořezáváním a kácením stromů a dřevin podle projektové dokumentace. Vzhledem k nepříznivému počasí, které zasáhlo Českou republiku na přelomu měsíce října a listopadu 2009, musely být práce v tomto měsíci částečně omezeny z důvodu zajištění bezpečnosti arboristů a dosažení správného postupu při ošetření dřevin.

V průběhu měsíce října až prosince 2009 realizoval vítězný uchazeč Zahrada Harta s.r.o. ošetření 54 ks dřevin, skácel 8 ks stromů v souladu s podmínkami odborného posudku a pod dohledem technického dozoru.

Kontrolní dny a zápisy ve stavební deníku byly prováděny v souladu s platnými podmínkami příjemce dotace z OP ŽP.

Fyzická realizace projektu „Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně“ byla dokončena v měsíci prosinci 2009. Všechny práce byly zajištěny a dokončeny v souladu s uzavřenou smlouvou a harmonogramem prací.

V současné době ještě probíhají činnosti související s administrací projektu, přípravou žádosti o platbu a s ukončením celého projektu.

Fotodokumentace z fyzické realizace projektu „Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně“

V průběhu měsíců říjen až prosinec 2009 proběhlo odborné arboristické ošetření dřevin v rámci projektu „Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně“ podpořeném z Operačního programu Životní prostředí. Odborné arboristické zásahy spočívaly v provedení zdravotních řezů a odlehčovacích

řezů, ošetření poranění, stažení a zabezpečení kosterních větví preventivními bezpečnostními vazbami.



Ošetření dřevin v severní části hřbitova dne 20. 10. 2009.



Pohled ze severní strany do ošetřené lipové aleje s průhledem na kostel sv. Vojtěcha - ze dne 30. 10. 2009.



Hřbitov sv. Vojtěcha dne 3. 11. 2009 a pohled na sklad větví v jižní části hřbitova.




Příprava arboristů na hřbitově sv. Vojtěcha na výstup do korun stromů - ze dne 26. 11. 2009.



Arboristé provádějící zdravotní řez v korunách vzrostlých lip - ze dne 26. 11. 2009.



Arboristé provádějící řez v korunách stromů - ze dne 26. 11. 2009.

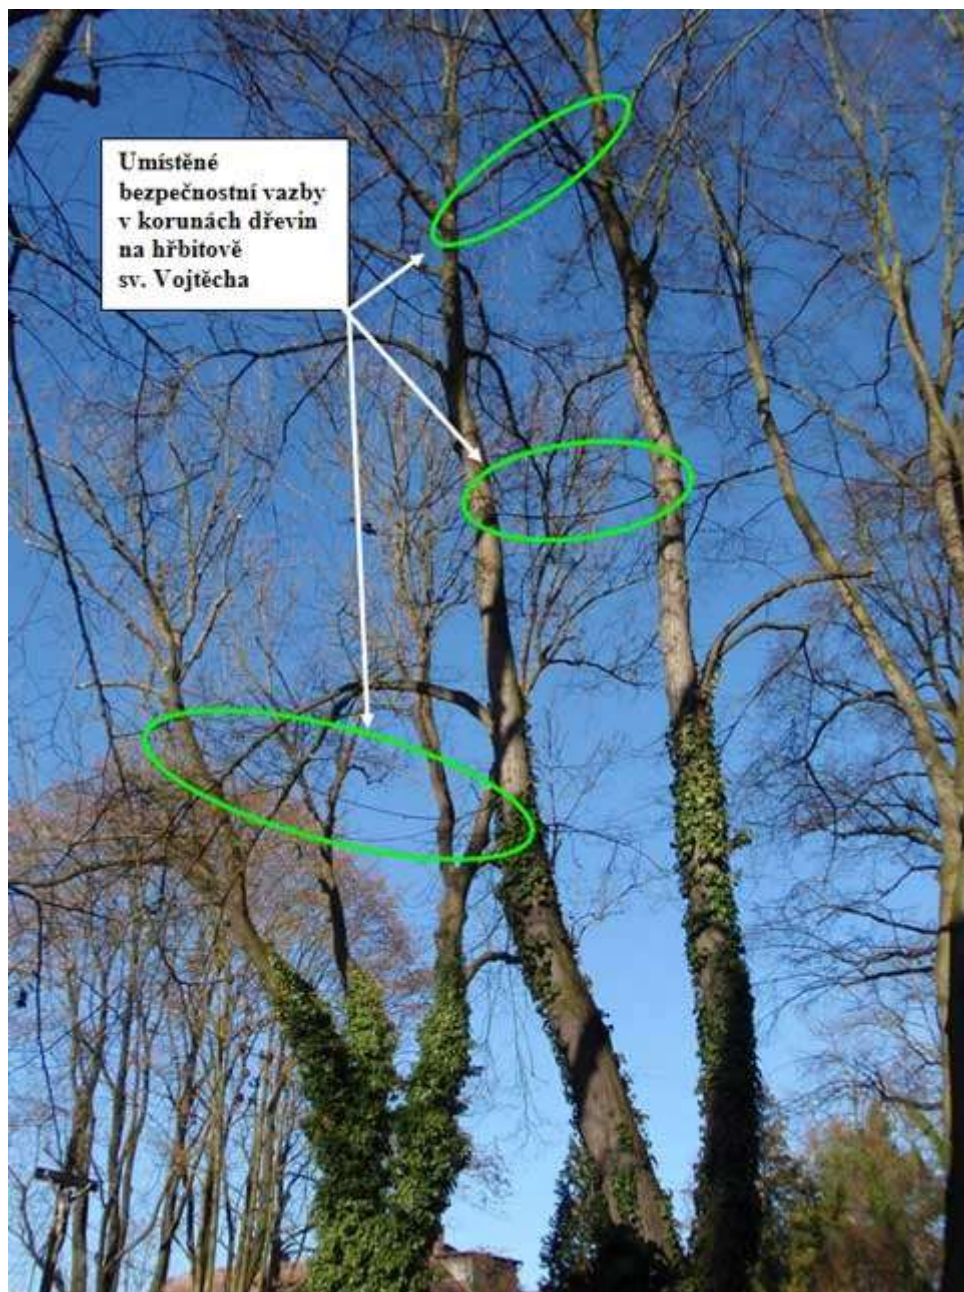

Umístění
bezpečnostní vazby
v korunách dřevin
na hřbitově
sv. Vojtěcha



Dne 26.11.2009 proběhl kontrolní den ošetřených dřevin na hřbitově sv. Vojtěcha. Na snímku zprava Luděk Hojný a Michal Kindl, zastupující zhotovitele provádějící ošetření dřevin a uprostřed Irena Dundychová – vykonávající technický dozor.

Projekt pokračoval podle plánovaného harmonogramu i přes nepříznivé počasí, které zasáhlo Českou republiku v měsíci na přelomu měsíců října a listopadu a práce musely být v tomto měsíci omezeny. Ke dni 26.11.2009 již bylo ošetřeno 52 ks stromů z plánovaných 54 kusů.



Kácení dřevin a nakládka dřevní hmoty ve ztížených podmínkách pomocí jeřábové techniky - dne 14.12.2009.



Dne 22.12.2009 proběhl kontrolní den, kde bylo zhodnoceno, že všechny práce byly provedeny a technický dozor neshledal žádné závady a nedodělky týkající se ošetření dřevin. Zleva Irena Dundychová – technický dozor, Luděk Hojný – zástupce zhotovitele provádějící ošetření dřevin a Josef Dušek – zastupující Technické služby Havlíčkův Brod.

Zodpovídá: Radim Tregler

Vytvořeno / změněno: 19.3.2010 / 19.3.2010
